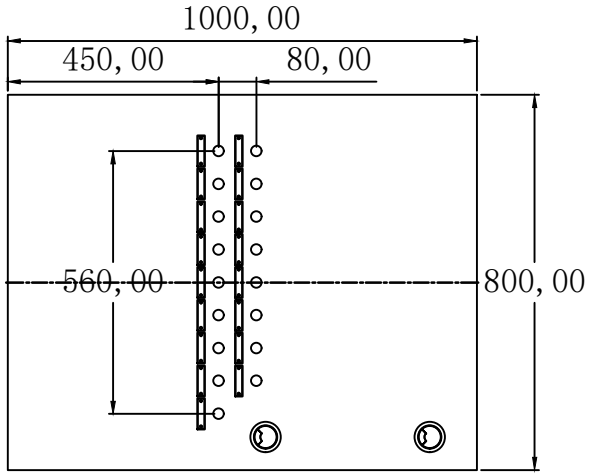

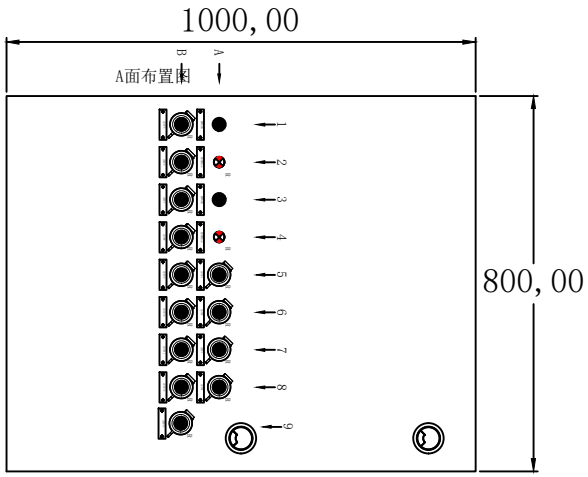



序号	定位	名称及规格	型　　号	第一行	第二行
17	B9	急停按钮	AVW302R	急停13	
16	B8	急停按钮	AVW302R	急停12	
15	B7	急停按钮	AVW302R	急停11	
14	B6	急停按钮	AVW302R	急停10	
13	B5	急停按钮	AVW302R	急停9	
12	B4	急停按钮	AVW302R	急停8	
11	B3	急停按钮	AVW302R	急停7	
10	B2	急停按钮	AVW302R	急停6	
9	B1	急停按钮	AVW302R	急停5	
8	A8	急停按钮	AVW302R	急停4	
7	A7	急停按钮	AVW302R	急停3	
6	A6	急停按钮	AVW302R	急停2	
5	A5	急停按钮	AVW302R	急停1	
4	A4	指示灯	YW1P-1BEQ4R	报警指示	
3	A3	蜂鸣器	LW1Z-1X4D	蜂鸣器	
2	A2	指示灯	YW1P-1BEQ4R	报警指示	
1	A1	蜂鸣器	LW1Z-1X4D	蜂鸣器	

标记框内容

标牌加工要求：
1、有机玻璃材质，透明，白纸打印；
2、尺寸：65mm×15mm，厚度为1.5mm；
3、字体要求：中文：黑体，其他：Arial；字高：美观即可，要统一大小；
4、排版要求：水平居中，垂直居中，均匀美观；
5、标牌采用螺丝固定；

版次 REV. NO.	描述 DESCRIPTION	设计 DESIGNED BY	校核 CHECKED BY	审核 REVIEWED BY	审定 APPD BY	日期 APPD. DATE
V3.0	供竣工	高东杰	储济华	毕宇		2021-12-16

SUPCON
浙江中控技术股份有限公司
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD.

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

港口事业部自动化改造项目气体检测与报警系统（GDS）系统

图纸名称 DWG. NAME	GDS-ES-130 机柜正视图
项目号 JOB NO.	
合同号 CONT NO.	SCJSD20210714-407
图号 DWG NO.	E-2400-00
设计阶段 DES.STAGE	竣工
页码 PAGE	第 5 张
SHEET	8
OF	
